




Bericht der Geschäftsführung WBN
Tourismus- und Wirtschaftsausschuss
23.10.2019




Gäste- und Übernachtungszahlen



Gästezahlen im Vergleich Jan. – Sept. 2018/2019



Übernachtungszahlen im Vergleich Jan. – Sept. 2018/2019





Kostenentwicklung
Nationalparkpromenade
und Dünenlandschaft

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

- laut Kostenbericht vom 17.10.19 ergeben sich Mehrkosten in Höhe von insgesamt ca. 525 T€
- die Obergrenze für eingesetzte Eigenmittel wird damit um netto 486 T€ überschritten
- Einsparmöglichkeiten in dieser Größenordnung sind nicht ersichtlich
- Mehrkosten sind aller Voraussicht nach durch die WBN allein zu tragen (keine Nachförderung)
- Finanzierung der Mehrkosten stellt die WBN vor keine Probleme

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

Mehr-/Minderkosten Wasserkante WEST

• Deckwerk/Spundwand	+ 325 T€
• Gründung Meeresterrassen	+ 129 T€
• Beleuchtung	+ 77 T€
• Stahlqualität Geländer	+ 67 T€
• diverses	+ 29 T€
• Ausguck	- 62 T€
• Rampe Deckwerk	- 24 T€
• Stufen Meeresterrassen	<u>- 16 T€</u>
Saldo	+ 525 T€

=====

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

Mehrkosten Deckwerk

• Spundwand	136.000 €
• Verguss	119.000 €
• Sandplanum	26.000 €
• Filtervlies	26.000 €
• diverses	<u>18.000 €</u>
Insgesamt	325.000 €
	=====

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

Mehrkosten Stahlqualität

• Handläufe Meeresterrassen	29.500 €
• Handläufe Salzwiese	<u>37.800 €</u>
Insgesamt	67.000 €
	=====

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

Mehrkosten Beleuchtung


• Handlaufbeleuchtung Rampen Deich	64.000 €
• Lichtpoller und Bodenleuchten Deichkronenweg	14.000 €
Insgesamt	<hr/> 78.000 € =====

Kostenentwicklung Nationalparkpromenade und Dünenlandschaft

Mehr-/Minderkosten Wasserkante WEST

• Deckwerk/Spundwand	+ 325 T€
• Gründung Meeresterrassen	+ 129 T€
• Beleuchtung	+ 77 T€
• Stahlqualität Geländer	+ 67 T€
• diverses	+ 29 T€
• Ausguck	- 62 T€
• Rampe Deckwerk	- 24 T€
• Stufen Meeresterrassen	- 16 T€
Saldo	+ 525 T€

=====

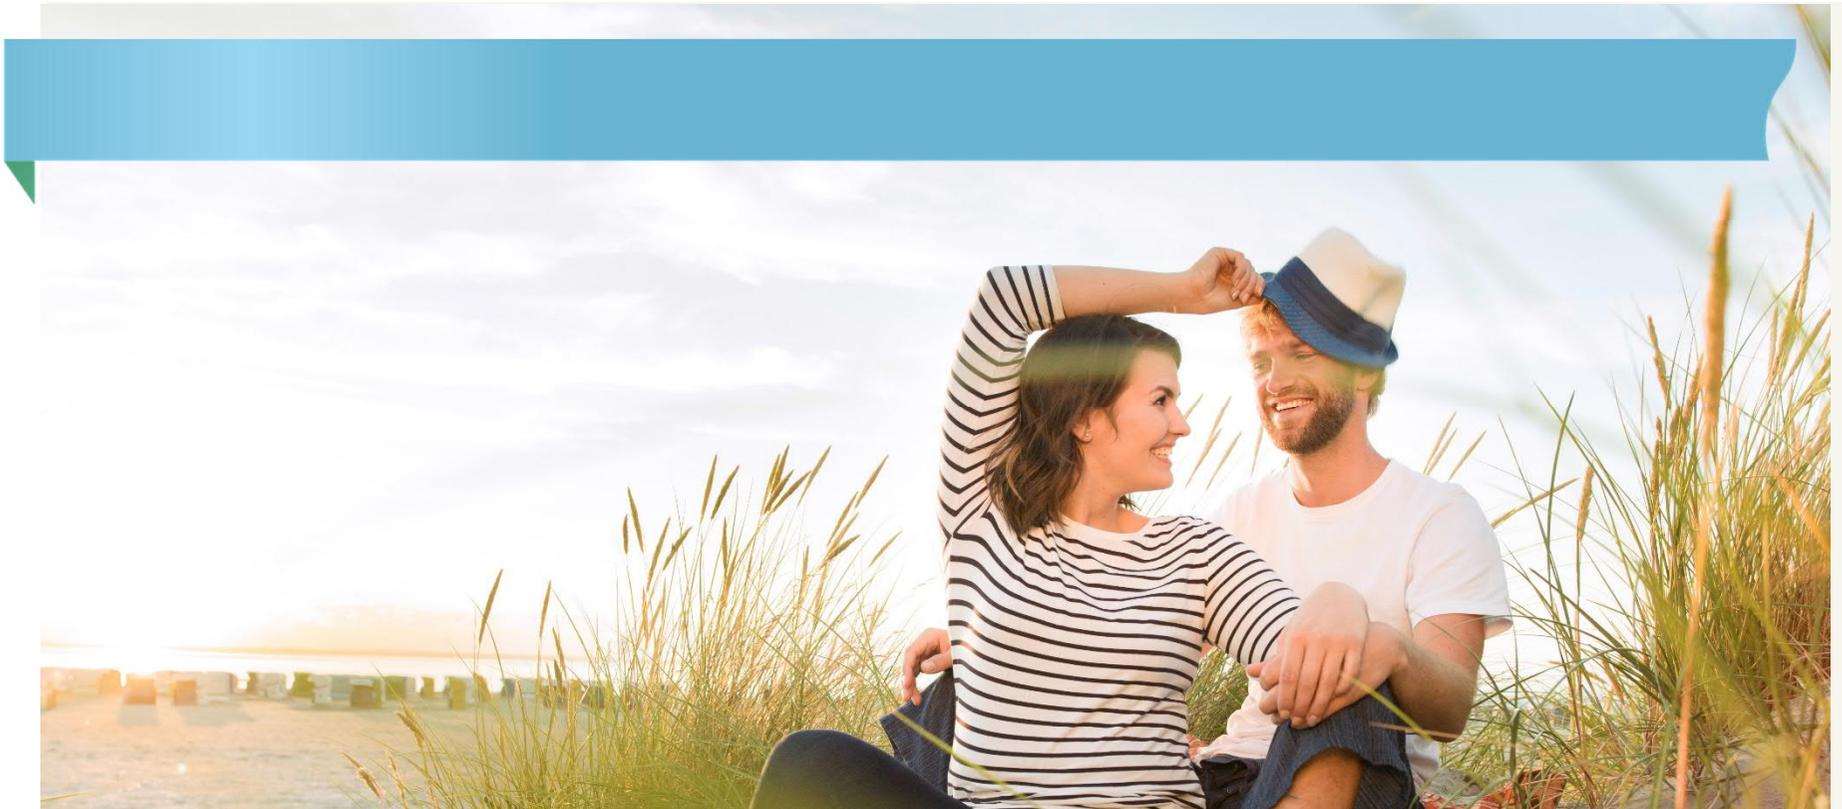

Vielen Dank!
